



# Správa o výsledku kontroly 2025

Plán obnovy a odolnosti  
– investície a reforma súdnej mapy

Najvyšší kontrolný úrad SR  
Ľubomír Andrassy, predseda

## Kontrolovali sme

### Vybrané sudy a Kanceláriu Najvyššieho správneho súdu SR

Reforma súdneho systému a súdnej mapy predpokladala zvýšenie dôveryhodnosti súdnictva, jeho výkonnosti a efektívnosti. Zároveň sa očakáva vyššia kvalita rozhodnutí, vyššia miera špecializácie sudcov a postupné skrátenie súdnych konaní. Súčasne by reformné zmeny mali investíciami z prostriedkov POO na modernizáciu budov a elektronizáciu procesov postupne priniesť sudcom a zamestnancom lepšie materiálne podmienky na dosiahnutie týchto cieľov. Kontrolnú vzorku tvorilo päť subjektov: tri okresné sudy, jeden krajský súd a Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR.

## Ako sme postupovali

Kontrolu vykonalo deväť kontrolórov (jeden expert, dvaja špecialisti, štyria seniori, jeden samostatný kontrolór a jeden junior) podľa zákona o NKÚ SR a štandardov, ktoré vychádzajú zo základných princípov kontroly v rámci medzinárodných štandardov najvyšších kontrolných inštitúcií (ISSAI). Použité boli metódy a techniky preskúmania dokladov, analýzy, písomné vyjadrenia, vysvetlenia a rozhovory so zamestnancami kontrolovaných subjektov.

## Prečo sme kontrolovali

Kontrola bola vykonaná z dôvodu identifikovania významných rizík v plnení opatrení ohľadne čerpania finančných prostriedkov z POO v podmienkach reformy súdnej mapy. POO je jedinečnou možnosťou z hľadiska zdrojov financovania na naplnenie jedného z cieľov tejto reformy, a to zlepšenie materiálnych podmienok pre výkon činnosti súdov a modernizáciu budov. Preverili sme stav zrealizovania plánovaných investícií viac ako rok a pol od spustenia reformy, zvlášť v súvislosti s plnením míľnikov POO a s cieľom poskytnutia objektívnych informácií verejnosti.

## Čo sme zistili

Vypracovanie legislatívy k reforme trvalo zdĺhavých 16 mesiacov. Schválená reforma je odlišná od pôvodne presadzovaného reformného zámeru. V legislatívnom procese došlo k zmenám, ktorých schválením v NR SR prišlo k podstatným rozdielom medzi pôvodným návrhom, resp. reformným zámerom a schválenými právnymi normami tvoriacimi reformu. Počet okresných súdov sa znížil z 54 na 36 súdov. Zanikajúce sudy sa zlúčili s nástupníckymi súdmi a pôvodné okresné sudy sa stali pracoviskami „nových“ okresných súdov, čím nedošlo k zásadnej zmene územnej pôsobnosti, ani k deklarovanému zvýšeniu ekonomickej efektivity správy súdov. Zachovaných bolo osem krajských súdov a reformný zámer predpokladal tri krajské sudy. Najpodstatnejšou zmenou je vznik sústavy správnych súdov, troch prvostupňových a Najvyššieho správneho súdu SR a zmena kauzálnnej príslušnosti krajských súdov. Merateľné ukazovatele, podľa informácií z kontrolovaných subjektov, na hodnotenie výsledkov reformy neboli pri príprave a implementácii ministerstvom stanovené. Nízke čerpanie finančných prostriedkov z POO pretrváva v dôsledku nesprávne nastavených časových rámcov (míľnikov), nedostatočnej reakcie na ich neplnenie, podcenením náročnosti procesov verejného obstarávania a problémov s administratívnymi kapacitami a nedostatočným manažmentom a podporou MS SR ako garanta ekonomickej správy súdov. Nesplnenie míľnikov a cieľov stanovených v POO pre oblasť súdnictva ohrozuje finančné prostriedky SR v ôsmej žiadosti o platbu z POO.

MS SR zlyháva pri manažovaní investícií súvisiacich s reformou súdnictva. Rezort by mal pristúpiť ku krízovému riadeniu plánovaných investícií, pretože reálne hrozí prepadnutie financií na rekonštrukciu budov súdov. Z prvej alokovanej sumy bezmála 124 mil. eur v rámci POO je predpokladaná finančná korekcia na úrovni 20 mil. eur. Z hľadiska výrazne nedostatočnej prípravy jednotlivých investičných projektov je vysoké riziko, že Slovensko nedokáže vyčerpať európsku pomoc pre opravu súdnych objektov. Významným zistením je tiež skutočnosť, že ministerstvo nie je schopné využiť bezmála päť miliónov eur určených na vybudovanie informačného systému - Centralizovaný systém súdneho riadenia.

Identifikované riziká môžu mať v konečnom dôsledku negatívny dopad na splnenie záväzkov Slovenska v rámci POO a to bude mať za dôsledok zníženie celkovej alokácie zdrojov určených na strategické reformy a rozvojové investície. Vláda SR musí na základe hĺbkovej revízie POO intenzívne rokovať s Európskou komisiou o možných úpravách národných záväzkov, aktivít a merateľných cieľov. Reforma súdnictva bola prijatá a spustená s výrazným časovým oneskorením, takmer 30 mesiacov, čo sa výrazne negatívne premieťa do realizácie investičných projektov. Investície z POO v rámci reformy justície musia byť implementované do 30. júna 2026.

Príkladom dobrej praxe môže byť spustenie činnosti Najvyššieho správneho súdu SR. V Kancelárii Najvyššieho správneho súdu SR národní kontrolóri neidentifikovali žiadne významné nedostatky pri použití verejných zdrojov. Zároveň je možné pozitívne hodnotiť budovanie analytickej jednotky, ktorá prispieva k efektívnemu, účelnému a transparentnému riadeniu Najvyššieho správneho súdu SR, popri existujúcich funkciách asistentov sudcov.

## Čo odporúčame

NKÚ SR odporúča ministerstvu:

- vypracovať a predložiť ústavnoprávnemu výboru NR SR akčný plán realizácie investícií a plnenia záväzkov vyplývajúcich z POO;
- zaviesť krízové riadenie subjektov realizujúcich investície z POO;
- pri presadzovaní reformných zámerov a legislatívnych zmien vychádzať z dátovej štruktúry, ktorá tvorí východiskovú a hodnotiacu základňu pre transparentné hodnotenie prínosov.

## VÝKON KONTROLNEJ AKCIE

### Účel kontrolnej akcie

Účelom kontroly bolo objektívnymi zisteniami prispieť k zlepšeniu procesov implementácie projektov, a to na základe preverenia aktivít, vzťahov a opatrení zodpovedných orgánov, identifikovaním problematických oblastí, a prostredníctvom na to nadväzujúcich odporúčaní. Cieľom kontroly bolo poukázať na vybraných kontrolovaných subjektoch na stav realizácie investícií financovaných z POO, naviazaných na reformu súdnej mapy.

### Rámec kontrolnej akcie


Počas výkonu kontroly boli použité metódy a techniky, ako štúdium dokladov a rozhovory so zamestnancami kontrolovaných subjektov. Kontrolovaným obdobím boli roky 2022 – 2024 a súvisiace obdobia.

### Výsledky kontrolnej akcie

#### Reforma justície z POO

POO predstavuje rozsiahly dokument reforiem a investícií pre SR. Zameriava sa na kľúčové problémy slovenskej ekonomiky a najdôležitejšie spoločenské výzvy. Zahŕňal 18 komponentov vrátane 64 reforiem a 60 investícií s časovým harmonogramom ich plnenia. Reforma justície rieši reorganizáciu súdnej mapy a investície do budov súdov a digitalizácie súdnictva.

Vývoj od predloženia prvého návrhu reformy súdnej mapy až po samotné spustenie reformy znázornený časovou osou, poukazuje na dĺžku tohto procesu.

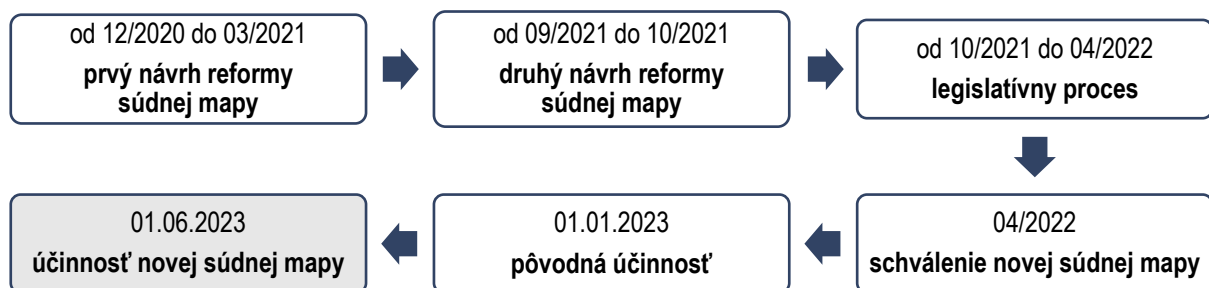

Zdroj: Spracované NKÚ SR

Od schválenia novej súdnej mapy po jej reálnu účinnosť – spustenie, ubehlo 13 mesiacov. Medzi hlavné príčiny dlhého legislatívneho procesu patrila rozsiahlosť reformy, potreba zapracovania pripomienok k legislatíve, zložitosť rokovaní pri podpore reformy v NR SR a vplyv pandémie COVID-19. Priamym dôsledkom tohto procesu je časový sklz v plánovaných investičných akciách z POO, ktoré boli naviazané na reformnú legislatívu. Pretrváva významné riziko nedodržania míľnikov POO, a z toho vyplývajúce ohrozenie využitia celkovej alokácie finančných prostriedkov z tohto jedinečného zdroja financovania modernizácie súdnictva. Vzniknutý nesúlad dvoch vzájomne súvisiacich procesov znamená riziko priameho negatívneho dopadu na štátny rozpočet SR a na financovanie deklarovaných potrieb súdnictva.

### Zásadné rozdiely medzi pôvodným a schváleným návrhom súdnej mapy

Legislatívny proces mal vplyv na zmeny v reformných materiáloch. Vznikli tak zásadné rozdiely medzi pôvodným reformným zámerom a schválenými normami reformy súdnictva. Súčasne nastal posun v účinnosti spustenia reformy. Pôvodný návrh reformy súdnej mapy z roku 2020 počítal so zavedením zásadných zmien v súdnom systéme SR, najmä s reorganizáciou súdov a súdnych obvodov. Ďalším stanoveným cieľom bolo efektívnejšie, rýchlejšie a kvalitnejšie rozhodovanie súdov prostredníctvom najmä vyššej miery špecializácie sudcov. Počet okresných súdov sa znížil z 54 na 36 súdov (vrátane vzniku štyroch mestských súdov v Bratislave a jedného v Košiciach). Zanikajúce sudy sa zlúčili s nástupníckymi súdmi a stali sa ich pracoviskami. Výsledné zmeny súdnej mapy, najmä týkajúce sa prvostupňových okresných súdov, považujeme len za formálne naplnenie pôvodne



stanovených zámerov bez zásadnej zmeny v ich činnosti a územnej pôsobnosti. Reforma nepriniesla zmeny v štruktúre krajských súdov a za čiastočné naplnenie zámeru možno považovať vznik Mestského súdu Košice. Za naplnenie pôvodných zámerov možno považovať len vznik sústavy správnych súdov a zmeny v kauzálnych príslušnostiach krajských súdov.

Tabuľka č. 1: Počet súdov pred reformou, podľa pôvodného návrhu a podľa schválenej reformy

| Reforma súdnej mapy | Počet okresných súdov | Počet krajských súdov | Počet mestských súdov | Agenda Obchodného registra | Počet správnych súdov |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| Stav pred reformou  | 54                    | 8                     | 0                     | 8                          | 0                     |
| Pôvodná reforma     | 30                    | 3                     | 2                     | 1                          | 4                     |
| Schválená reforma   | 36 + 15 pracovísk     | 8                     | 5                     | 8                          | 4                     |

Zdroj: Spracované NKU SR

## Stav čerpania finančných prostriedkov z POO

Z celkového objemu finančných prostriedkov na renováciu budov z POO – v sume 123,8 mil. eur, neboli do konca roka 2024 vyčerpané žiadne prostriedky. Kontrolované súdy – Krajský súd v Košiciach, Okresný súd Bardejov, Okresný súd Prešov, ako aj Okresný súd Spišská Nová Ves, k 1. novembru 2024 nečerpali žiadne finančné prostriedky. V dvoch prípadoch boli predložené žiadosti o platbu, súvisiace s výdavkami za investičnú štúdiu, resp. projektovú dokumentáciu. Do konca výkonu kontroly však neboli preplatené.

Podľa Správy o pokroku v implementácii POO – aktualizácia so stavom k 31. januáru 2025, bola projektová dokumentácia dokončená len v šiestich (okrem iného projektovú dokumentáciu zaobstarali Krajský súd v Košiciach, Okresný súd Spišská Nová Ves) z 19 prípadov (okrem iného projektovú dokumentáciu nezaobstaral Okresný súd Prešov). Zároveň bolo zabezpečené vyhlásenie verejného obstarávania len v dvoch projektoch (Krajský súd v Košiciach, Okresný súd Banská Bystrica) zo 14 (okrem iného verejné obstarávanie nevyhlásil Okresný súd Spišská Nová Ves) na zhotoviteľa obnovy budov súdov.

Tabuľka č. 2: Stav investičného projektu POO - Modernizácia budovy Krajského súdu v Košiciach (v celkovej sume 24,4 mil. eur bez DPH podľa zmluvy o poskytnutí prostriedkov z POO), so stavom k 31. januáru 2025

|                                                                                                                              | Predpokladaný termín splnenia | Skutočný termín splnenia |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Podpis dodatku k zmluve o dielo s projektantom                                                                               | 3/2023                        | 7/2023                   |
| Projektová dokumentácia - dokumentácia zmena stavby pred dokončením                                                          | 6/2023                        | 12/2023                  |
| Predložiť Národnej implementačnej a koordinačnej autorite priame vyzvanie na rekonštrukciu budovy Krajského súdu v Košiciach | 12/2023                       | 4/2024                   |
| Vyhlasenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby                                                                      | 1/2024                        |                          |
| Podpis zmluvy so zhotoviteľom stavby                                                                                         | 9/2024                        |                          |
| Ukončenie stavebného konania a vydanie stavebného povolenia (zmena stavby pred dokončením)                                   | 12/2024                       |                          |
| Podpis zmluvy so zhotoviteľom stavby                                                                                         | 9/2024                        |                          |
| Realizácia stavby                                                                                                            | 12/2025                       |                          |
| Dokumentácia skutočného vyhotovenia                                                                                          | 1/2026                        |                          |
| Kolaudácia budovy a predloženie kolaudačného rozhodnutia                                                                     | 3/2026                        |                          |

Zdroj: Semafor investičných projektov - Modernizácia budovy Krajského súdu v Košiciach – POO

V júli 2023 bol POO aktualizovaný a záväzné míľniky boli predĺžené. Z dôvodu úpravy alokácie finančných prostriedkov v Komponente 15 na rekonštrukciu bodov súdov na 123,8 mil. eur došlo k zmene kapacít. Konkrétne sa musí zrenovovať aspoň 111 931 m<sup>2</sup> (pôvodne 77 500 m<sup>2</sup>) súdnych budov. Investície do budov súdov naďalej významne meškajú. Dôkazom toho je aj uznesenie vlády SR č. 24 z 15. januára 2025, ktorým bol príslušný podpredseda vlády SR poverený rokovať s Európskou komisiou o základných východiskách pre revíziu POO a o úprave alokácie finančných prostriedkov v Komponente 15 na rekonštrukciu budov súdov zo 123,8 mil. eur na 103,6 mil. eur.

Nedostatočné čerpanie finančných prostriedkov bolo spôsobené nesprávne nastavenými časovými rámcami míľnikov a cieľov, ktoré boli vzhľadom na dostupné administratívne kapacity a časovú náročnosť neprimerane ambiciózne. Kľúčovým problémom je nezvládnutie manažmentu vzťahu medzi legislatívnymi zmenami a súvisiacimi procesmi plánovaných investícií z POO. K problému prispelo aj podcenenie času potrebného na verejné obstarávanie vzhľadom na jeho zložitosť, nedostatočná administratívna kapacita MS SR a komplikovanosť ďalších administratívnych postupov. Tieto faktory poukazujú na zlyhanie projektového riadenia pri realizácii investícií do súdnych budov a IT infraštruktúry. Ekonomickú, finančnú a organizačnú správu súdov (v rozsahu stanovenom v zákone) vykonáva MS SR, čím je jednoznačná aj zodpovednosť za manažment investícií.

Zložité posudzovacie a schvaľovacie postupy v rámci stavebných konaní i rozsiahla zmena stavebného zákona, účinná od apríla 2025, môžu byť ďalším rizikom, ktoré bude mať vplyv na už teraz meškajúce investície do rekonštrukcie budov súdov.

Míľnik aj cieľ, ktorý sa už nepodarí splniť, sa týka informačného systému – Centralizovaný systém súdneho riadenia, v sume 4,7 mil. eur. Tento systém mal mať rozhodujúci vplyv na zvýšenie efektívnosti súdnictva. Jednotná centralizovaná databáza údajov mala slúžiť ako základ aj pre sledovanie počtu, stavu a dĺžky súdnych konaní. Kľúčom k efektívnej reforme súdnej mapy sa javí práve pokročilá digitalizácia, prostredníctvom ktorej by sa zlepšili pracovné podmienky sudcov a súdnych úradníkov. Keďže nový systém nebude zavedený, súdy budú musieť aj naďalej využívať síce pravidelne aktualizovaný a funkčný, no zastaraný informačný systém, zavedený v roku 2001.

### Nestanovenie merateľných ukazovateľov

Kľúčovou vlastnosťou výsledku je jeho merateľnosť. Výsledky musia byť merateľné, aby sa objektívne zhodnotilo, či bol cieľ dosiahnutý a v akej miere, pričom meranie umožňuje sledovať pokrok alebo vykonávať potrebné úpravy. MS SR v rámci prípravy a implementácie reformy súdnej mapy nestanovilo merateľné ukazovatele pre hodnotenie a vyhodnocovanie cieľov a očakávaných výsledkov reformy (špecializáciu, rýchlosť konania, dostupnosť, kvalitu). Tieto kritériá neboli zahrnuté v žiadnom z návrhov reformy, ani v jej schválenej verzii. Ciele stanovené v návrhoch reformy neboli zdôvodnené údajmi, ktoré by bolo možné porovnať s dosiahnutými výsledkami. V dôsledku toho nebude možné overiť, či reforma skutočne naplnila stanovené ciele, čo môže vyvolávať oprávnené pochybnosti o objektívnosti budúcich hodnotení jej úspešnosti. Zároveň k 1. augustu 2024 došlo k zrušeniu Analytického centra MS SR, pričom jeho agenda bola presunutá vecne príslušným sekciám a odborom ministerstva. Je nevyhnutné konštatovať, že MS SR nepracovalo pri tvorbe zmien a zámerov s jednotnou dátovou štruktúrou, implementovanou na subjektoch v pôsobnosti ministerstva, a jej merateľnými ukazovateľmi.

### Špecializácia sudcov

Jedným zo zámerov reformy súdnej mapy bolo okrem zväčšenia súdnych obvodov aj zvýšenie miery špecializácie sudcov, ktorá mala prispieť k rýchlejšim, kvalitnejším súdnym rozhodnutiam. V kontrolovaných subjektoch boli identifikované tieto dôsledky reorganizácie súdnej mapy z hľadiska špecializácie.

V dôsledku zväčšenia súdneho obvodu a postúpenia dovtedy nevybavených spisov z Krajského súdu v Prešove došlo na Krajskom súde v Košiciach ku krátkodobému personálnemu poddimenzovaniu obchodnoprávneho úseku. Aj keď personálne poddimenzovanie bolo postupne riešené navýšením počtu miest sudcov, podľa súdnej štatistiky to viedlo k prehĺbeniu existujúcich prieťahov súdnych konaní, vrátane dopadu na ich účastníkov.

V rámci súdneho systému/sústavy súdov jednotlivé kontrolované subjekty nedisponujú údajmi ohľadne zachovania dostupnosti súdov, čo bolo jedným z očakávaných cieľov reformy. V súvislosti so zmenami obvodov aj zmenami kauzálnej príslušnosti na krajských súdoch možno predpokladať, že došlo k zvýšenému finančnému zaťaženiu účastníkov súdnych konaní.

### Záver

Reorganizácia súdnej mapy priniesla zníženie počtu okresných súdov z 54 na 36. Zanikajúce okresné súdy sa však zlúčili s nástupníckymi súdmi a stali sa ich pracoviskami, čo považujeme za formálne zníženie bez výraznejších pozitívnych efektov na verejný rozpočet. Zároveň ostalo zachovaných všetkých osem krajských súdov. Zreorganizovanie systému súdov cez zníženie ich počtu malo zvýšiť efektívnosť a kvalitu súdnictva. Údaje o špecializácii, rýchlosti konaní, dostupnosti a kvalite súdov sa na účely hodnotenia efektívnosti systému nezisťovali ani pred reformou, ani po reforme.

Merateľné ukazovatele pre budúce hodnotenia výsledkov reformy ministerstvo nestanovilo ani počas prípravy, ale ani pri implementácii reformy. Existuje preto reálne riziko, že reformu nebude možné objektívne vyhodnotiť.

Príprava a nastavenie reformy súdnej mapy, ako aj jej následná realizácia, mali prebiehať po prijatí legislatívneho rámca účinného od 31. decembra 2021. Vzhľadom na to, že legislatíva bola schválená v apríli 2022 s následnou zmenou, resp. posunom spustenia reformy na jún 2023, došlo k vážnym oneskoreniam pri čerpaní investícií z POO. Na investície do renovácie budov z POO neboli do novembra 2024 čerpané žiadne finančné prostriedky. V rámci investícií z Komponentu 15 POO bolo do konca roka 2024 z celkovej alokácie 232,8 mil. eur vyčerpaných 83,7 mil. eur. Išlo napr. o výdavky obstaranie budov, na platy, modernizáciu IT vybavenia.

Pripravovaná revízia POO navrhuje úpravu sumy na rekonštrukciu budov súdov z pôvodných 123,8 mil. eur na 103,6 mil. eur. Míľnik a cieľ, ktorý sa už nepodarí splniť, sa týka informačného systému – Centralizovaného systému súdneho riadenia, v sume 4,7 mil. eur. Malo pritom ísť o kľúčový prvok reformy súdnej mapy.

Hlavnými dôvodmi meškajúcich investícií boli nesprávne nastavené časové rámce míľnikov a cieľov, podcenenie času potrebného na vykonanie verejného obstarávania, zložitosť pravidiel verejného obstarávania, čas potrebný na vykonanie finančnej kontroly, ako aj ďalšie administratívne postupy a problémy s administratívnou kapacitou.

Kontrola na vybraných subjektoch ukazuje, že s nedostatočným riadením a implementáciou aj novoprijatých opatrení MS SR, týkajúcich sa realizácie investícií z POO, naďalej pretrváva významné riziko nesplnenia termínu čerpania finančných prostriedkov pre oblasť justície, čo predstavuje zásadnú finančnú stratu pre modernizáciu súdnictva v SR.

POO predstavuje jedinečnú príležitosť na modernizáciu súdnych budov a modernizáciu činnosti a správy súdov SR. Nevyužitie zdrojov z POO je významným rizikom pre budúce výdavky štátneho rozpočtu SR na potrebnú modernizáciu súdnictva a jeho správy.

Investície v oblasti súdnictva sú súčasťou balíka reforiem a investícií, ktoré budú predmetom ôsmej žiadosti o platbu SR vo výške 550 mil. eur. Zdržanie alebo nesplnenie čo i len jedného míľnika, napr. z oblasti súdnictva, ohrozuje podanie celej žiadosti o platbu Európskej komisii. V dôsledku zlého manažovania investícií MS SR tak môže SR prísť nielen o investície z oblasti súdnictva, ale o celú splátku vo výške 550 mil. eur z ôsmej žiadosti o platbu.

### Reakcia kontrolovaného subjektu

Z kontrolnej akcie bolo vypracovaných päť záznamov o výsledku kontroly, ktoré boli v zmysle zákona o NKÚ SR odovzdané štatutárnym zástupcom kontrolovaných subjektov. Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR podala počas výkonu kontroly sťažnosť v zmysle zákona o sťažnostiach. Na základe jej prešetrenia NKÚ SR dospel k záveru, že neboli zistené pochybenia (nedostatky), ktoré by mali vplyv na pravdivosť, úplnosť a preukázateľnosť skutočností zistených pri kontrole.

## Kontakt

### Najvyšší kontrolný úrad SR

Priemyselná 2  
824 73 Bratislava 26  
☎ +421 250 114 911  
✉ [info@nku.gov.sk](mailto:info@nku.gov.sk)

### Krajský súd v Košiciach

Štúrova 29  
041 51 Košice  
☎ +421 558 870 112  
✉ [ivica.rihova@justice.sk](mailto:ivica.rihova@justice.sk)

### Okresný súd Bardejov

Partizánska 1  
085 75 Bardejov  
☎ +421 548 882 180  
✉ [infocentrum.osbj@justice.sk](mailto:infocentrum.osbj@justice.sk)

### Okresný súd Prešov

Grešova 3  
080 42 Prešov  
☎ +421 518 881 191  
✉ [infocentrum.ospo@justice.sk](mailto:infocentrum.ospo@justice.sk)

### Okresný súd Spišská Nová Ves

Stará cesta 3  
052 80 Spišská Nová Ves  
☎ +421 538 876 180  
✉ [mariana.kostelnikova@justice.sk](mailto:mariana.kostelnikova@justice.sk)

### Kancelária Najvyššieho správneho súdu

Trenčianska 56/A  
821 09 Bratislava 3  
☎ +421 2 321 33 313  
✉ [kancelaria@nssud.sk](mailto:kancelaria@nssud.sk)

## Zoznam použitých skratiek

| Skrátený názov       | Úplné znenie                                                                                          |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IT                   | Informačné technológie                                                                                |
| mil.                 | milión                                                                                                |
| MS SR, ministerstvo  | Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky                                                      |
| NR SR                | Národná rada Slovenskej republiky                                                                     |
| POO                  | Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky                                                          |
| SR                   | Slovenská republika                                                                                   |
| zákon o NKÚ SR       | zákon č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov |
| zákon o sťažnostiach | zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov                                     |
