



# Správa o výsledku kontroly 2025

## System implementácie integrovaného územného rozvoja v podmienkach SR (IÚS NUTS 3 a IÚS UMR)

Najvyšší kontrolný úrad SR  
Ľubomír Andrassy, predseda

## Kontrolovali sme

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Košický samosprávny kraj a mesto Košice

Kontrolná akcia bola zameraná na nastavenie systému koordinácie, overenie implementácie a dosahovanie deklarovaných cieľov územných investícií a rozvoja na vybranom území v programovom období 2021 až 2027. Kontrola bola vykonaná na MIRRI SR – RO pre Program Slovensko 2021–2027 a ako pilotná v KSK a meste Košice, ktoré plnia úlohu gestorov prípravy a implementácie IÚS pre Košický kraj a UMR Košice. Súčasťou preverenia boli aj Rada partnerstva Košického kraja a Kooperačná rada UMR Košice, ktoré koordinujú prípravu IÚS, schvaľujú IÚS a projektové zámery IÚI v rámci Programu Slovensko.

## Ako sme postupovali

NKÚ SR použil pri výkone kontroly kontrolórske postupy a techniky vychádzajúce z medzinárodných kontrolórskych štandardov, najmä preskúmavanie dokladov a dokumentov, analytické metódy, rozhovory so zainteresovanými osobami a benchmark s Českou republikou. Kontrolovaným obdobím boli roky 2021 – 2024. Preverených bolo 17 projektových zámerov IÚI, z toho 11 projektových zámerov IÚI, ku ktorým bola k 31. 12. 2024 podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP a šesť projektových zámerov, pri ktorých mali žiadatelia k 31. 12. 2024 predložené ŽoNFP u poskytovateľa.

## Prečo sme kontrolovali

V programovom období 2021 až 2027 môže Slovensko využiť 12,6 mld. eur z fondov EÚ, z čoho 2,41 mld. eur (19,2 %) sa realizuje prostredníctvom mechanizmu IÚI. Nástroj IÚI zahŕňa investície, ktoré prepájajú viaceré fondy, programy alebo priority toho istého programu. Je určený najmä na väčšie strategické projekty s významným územným dopadom, pričom malé projekty by mali byť podporované najmä v záujme dosahovania synergických efektov. Hlavnou myšlienkou IÚI je komplexná realizácia projektov a investícií v rôznych oblastiach v rámci viacerých špecifických cieľov Programu Slovensko tak, aby sa vzájomne podporili a spoločne prispeli k napĺňaniu cieľov. Kontrolu mechanizmu IÚI sme realizovali z dôvodu identifikácie rizík, ktoré ohrozujú implementáciu uvedeného systému. Išlo najmä o náročnosť, zdĺhavosť systému a nedostatočnú integráciu projektov.


## Čo sme zistili

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR:

- Nedostatočným plnením úloh vyplývajúcich z postavenia ministerstva ako RO, neboli zabezpečené adekvátne podmienky pre implementáciu IÚI včas a jednoznačne. Ministerstvo zároveň čiastočne splnilo úlohu vyplývajúcu z Uznesenia vlády SR, pretože nedošlo k vyhláseniu všetkých výziev IÚI v požadovanom termíne. Vyhlásenie výziev IÚI zo strany RO charakterizovalo nedostatočné plánovanie a koordinácia.
- Dlhodobá harmonizácia a opakované úpravy štatútov Rady partnerstva KSK a Kooperačnej rady UMR Košice spomalili proces implementácie IÚR.
- Prvé technokratické rozdelenie alokácie zo strany MIRRI SR v novembri 2022 bolo bez územnej konzultácie a neodrážajúce regionálne potreby.

KSK a mesto Košice:

- IÚS Košického kraja bola schválená aj napriek výhradám zástupcov štátnej správy. KSK nezabezpečil jej monitorovanie za rok 2023 v súlade so stanovenými pravidlami a zákonom o podpore regionálneho rozvoja.
- Radou partnerstva Košického kraja a Kooperačnou radou UMR Košice schválené projektové zámery IÚI nemali integrovaný a strategický charakter. Boli to individuálne projektové zámery IÚI a riešili skôr investičný dlh žiadateľa. Išlo o modernizácie a revitalizácie, obnovy a rekonštrukcie majetku.
- Rada partnerstva Košického kraja a Kooperačná rada UMR Košice pri schvaľovaní projektových zámerov IÚI nevyužili možnosť stanovenia kritérií pre výber projektov, čím nezabezpečili transparentnosť procesu ich výberu. Dôraz kládli na ich rýchle schvaľovanie a tým aj skoré čerpanie finančných prostriedkov namiesto ich prínosu pre územie.
- Obmedzený prístup sekretariátov oboch rád do verejnej časti ITMS21+ sťažoval plnenie ich úloh a zvyšoval administratívnu záťaž pri manuálnom získavaní údajov.
- Ku koncu I. polroku 2025 dosiahnutý stav implementácie IÚI poukazuje na významné meškanie. Úroveň zazmluvnenia (13 % v rámci KSK a 20 % v rámci UMR Košice) a takmer nulové čerpanie signalizujú riziko ohrozenia efektívneho využitia dostupnej alokácie a tlaku na dočerpanie zdrojov v krátkom čase.

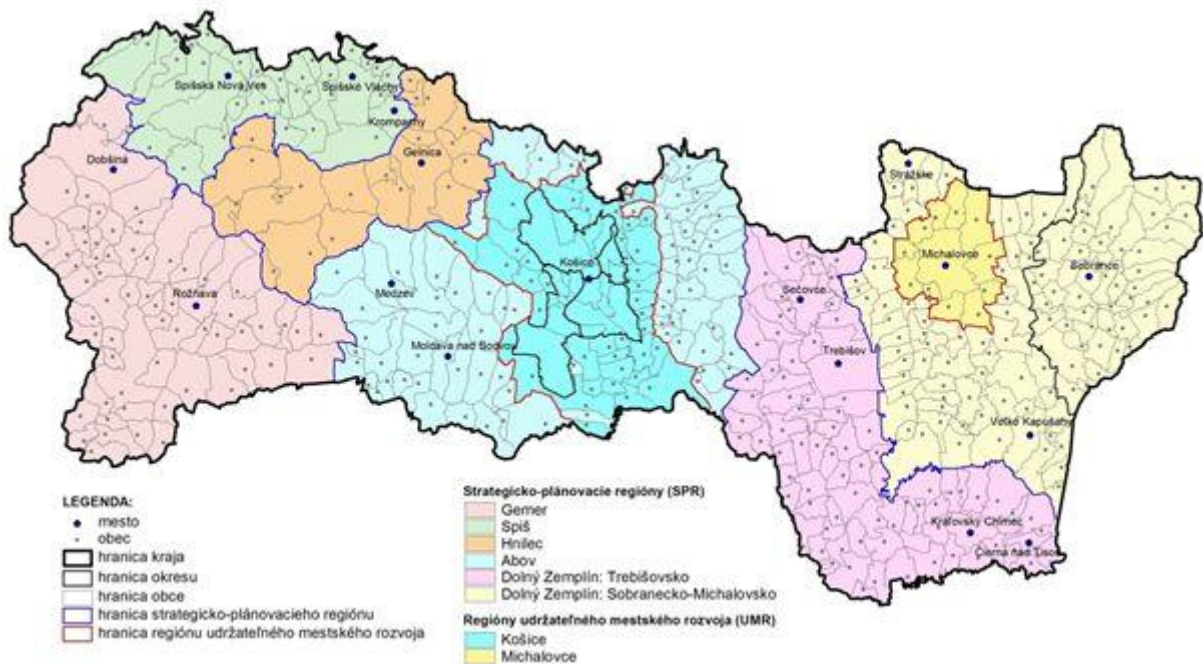

Zdroj: KSK

## Čo odporúčame

NKÚ SR odporúča Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, aby zaviazal MIRRI SR

- začať prípravu implementácie nástroja IÚI pre programové obdobie po roku 2027, bezprostredne po zverejnení legislatívneho návrhu o Európskych štrukturálnych a investičných fondoch na obdobie po roku 2027, a zabezpečiť, bezprostredne po schválení operačného programu Európskou komisiou pripravenosť a vyhlásenie prvých výziev, resp. výziev;
- zabezpečiť aktualizáciu metodiky tvorby IÚS tak, aby schválená IÚS dôsledne zohľadňovala integrovanosť riešení a opatrení a zároveň sa na jej schválení podieľalo aj MIRRI SR;
- predkladať Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Výročnú správu o pokroku implementácie IÚI.

## VÝKON KONTROLNEJ AKCIE

### Účel kontrolnej akcie

Účelom kontrolnej akcie bolo poukázať na náročnosť a zdĺhavosť systému implementácie integrovaného územného rozvoja v prebiehajúcom programovom období a prispieť k jeho zlepšeniu.

Cieľom bolo získať objektívne poznatky o stave systému riadenia implementácie.

### Rámec kontrolnej akcie

Kontrola bola vykonaná ako kontrola súladu. Kontrolovaným obdobím boli roky 2021 až 2024 a súvisiace obdobia. Kontrola sa zamerala na implementáciu IÚI na úrovni MIRRI SR, Košického kraja a UMR Košice. Jej súčasťou bolo posúdenie zriadenia a činnosti regionálnych a miestnych koordinačných štruktúr. Kontrolóri zároveň na vybranej vzorke dokladov preverili proces výberu, hodnotenia, schvaľovania projektových zámerov IÚI a vydávania rozhodnutia o poskytnutí príspevkov z fondov EÚ pre projekty IÚI. Hodnotiacimi kritériami boli relevantné časti legislatívy Slovenskej republiky, najmä zákon o príspevkoch z fondov EÚ a zákon o podpore regionálneho rozvoja, a metodických usmernení MIRRI SR pre preverovanú oblasť, platné v kontrolovanom období. Zistenia, odporúčania a štatistiky sa týkajú len kontrolovaných subjektov v rámci Košického kraja a neplatia pre iné kraje, resp. územia UMR. V ostatných regiónoch Slovenska môže existovať odlišná aplikácia metodického usmernenia, kapacitné pomery, ktoré môžu ovplyvniť dynamiku a efektivitu obdobných procesov.

### Výsledky kontrolnej akcie

#### Implementačná štruktúra

Mechanizmus implementácie IÚR je založený na princípe partnerstva, pričom viacúrovňové riadenie sa uplatňuje najmä pri príprave, schvaľovaní, implementácii, monitorovaní a hodnotení IÚS a IÚI, ktoré sa vykonáva v partnerstve zástupcov samospráv a miestnych partnerov.

Implementačnú štruktúru IÚR tvoria viaceré úrovne a subjekty. Na národnej úrovni je to MIRRI SR v pozícii RO, spolu s jeho regionálnymi centrami a SO. Na úrovni samosprávneho kraja funguje Rada partnerstva spolu s technickým sekretariátom Rady partnerstva. V rámci UMR je zodpovedná Kooperačná rada UMR spolu s jej administratívnymi kapacitami. V programovom období 2021 až 2027 vzniklo 8 novovytvorených Rád partnerstva na území VÚC (úroveň NUTS 3) a 18 Kooperačných rád UMR, ako riadiacich štruktúr koordinujúcich procesy plánovania, implementácie a monitorovania. Rady partnerstva a Kooperačné rady koordinujú prípravu IÚS, schvaľujú IÚS a schvaľujú projektové zábery IÚI, ktorých predmet patrí do ich pôsobnosti v rámci Programu Slovensko.

Zriadenie Rady partnerstva Košického kraja a Kooperačnej rady UMR Košice, spolu so schválením IÚS, bolo základným predpokladom pre realizáciu integrovaného územného rozvoja podľa nariadenia o spoločných ustanoveniach. Obidve rady mali upravené postavenie, zloženie, úlohy, výkon činnosti a spôsob rozhodovania prostredníctvom štatútov a rokovacích poriadkov schválených MIRRI SR.

Rada partnerstva Košického kraja bola pôvodne ustanovená v decembri 2020. V dôsledku metodických zmien došlo k jej opätovnému ustanovujúcemu zasadnutiu v apríli 2023, na ktorom bol prijatý štatút rady. Tento bol v priebehu roku 2024 opätovne aktualizovaný. V júni 2024 sa počet členov rozšíril z pôvodných 26 na 29 členov, keďže sa počet zástupcov niektorých strategicko-plánovacích regiónov rozšíril z jedného na dvoch.

Kooperačná rada UMR Košice bola ustanovená v marci 2021, pričom jej prvé zasadnutie predsedníctva sa konalo až v decembri 2022. V priebehu troch rokov existencie boli schválené tri rôzne verzie štatútu, ovplyvnené

metodickými zmenami zo strany riadiaceho orgánu. Od pôvodného komorového modelu s predsedníctvom sa Kooperačná rada UMR Košice transformovala na model, v ktorom všetkých 68 členov rozhodovalo spoločne.

Spoločným znakom činnosti oboch rád zo začiatku bola ich dlhodobá nečinnosť, ktorá spôsobila oneskorený štart reálnej implementácie projektových aktivít. K schváleniu prvých projektových zámerov došlo až v máji 2024. Vzájomná spolupráca oboch rád je založená na princípe partnerstva ustanoveného v ich štatútoch a v zákone o príspevkoch z fondov EÚ. Kontrola NKÚ SR však preukázala, že reálna spolupráca bola obmedzená a nesystematická.

Na ustanovujúcom zasadnutí Rady partnerstva Košického kraja v apríli 2023 boli pri schvaľovaní štruktúry rady zvolení piati členovia komory sociálno-ekonomických partnerov, pričom kritériá a postup ich nominácie neboli podložené jasným a transparentným výberovým procesom.

NKÚ SR odporučil kontrolovanému subjektu za účelom zvýšenia transparentnosti systému implementácie, vytvoriť nominačný a výberový mechanizmus pre nomináciu zástupcov komory sociálno-ekonomických partnerov.

Komplexné organizačné a odborné úlohy Rady partnerstva Košického kraja, vrátane poskytovania poradenstva žiadateľom, administratívneho overovania predložených formulárov projektových zámerov IÚI a vypracovania stanovísk zabezpečuje technický sekretariát Rady partnerstva Košického kraja. V prípade Kooperačnej rady UMR Košice tieto funkcie sú realizované cez administratívne kapacity UMR Košice. Úlohy, ktoré vyplývajú pre subjekty implementačného mechanizmu IÚI z prebiehajúcich procesov sú uvedené v prílohe č. 1 tejto Správy o výsledku kontroly.

Implementácia IÚR bola sprevádzaná vysokou administratívnou náročnosťou spôsobenou častými zmenami metodiky, ktoré si súbežne vyžadovali prepracovanie a vyplňanie nových, rozšírených formulárov projektových zámerov IÚI, opätovné spracovanie a úpravy v už existujúcich uzneseniach rád. Ďalším problémom bolo nedostatočné vyškolenie zamestnancov na spracovanie projektových zámerov IÚI na začiatku a časté nejasností u žiadateľov pri ich spracovaní.

Náročnosť implementácie IÚR vyplývala aj z nejednotnosti medzi návrhmi podmienok poskytnutia príspevku a finálnymi výzvami, najmä v oblasti oprávnených aktivít, oprávnených žiadateľov a merateľných ukazovateľov. Zmeny vo výzvach oproti podmienkam poskytnutia príspevku spôsobili zdržania pri príprave projektových zámerov IÚI a zvyšovali riziko ich opätovného schvaľovania. Merateľné ukazovatele, ktorých cieľové hodnoty mali rady dosiahnuť, boli Rade partnerstva Košického kraja a Kooperačnej rade UMR Košice doručené oneskorene. Úprava ich hodnôt, aj z dôvodu neschopnosti ich naplnenia, bola predmetom rokovaní s MIRRI SR.

Kontrola NKÚ SR zistila, že MIRRI SR nezabezpečilo pre zamestnancov technického sekretariátu Rady partnerstva Košického kraja a administratívnych kapacít Kooperačnej rady UMR Košice prístup k úplným a spoľahlivým údajom o stave projektov IÚI v systéme ITMS21+, čo im komplikovalo plnenie ich úloh. Ešte v apríli 2025 ich zamestnanci nemali prístup do neverejnej časti ITMS21+. Obmedzený prístup im výrazne sťažil sledovanie stavu projektov, identifikáciu zdržaní a duplicit či prípravu kvalitných podkladov pre rozhodovanie, zároveň predlžoval administratívne procesy a zvyšoval ich náročnosť. Potrebne informácie získavali vyžiadanim údajov od MIRRI SR, SO a žiadateľov spoliehaním sa na manuálnu komunikáciu mimo systému e-mailami a telefonickou komunikáciou.

V súlade s nariadením o spoločných ustanoveniach v podmienkach SR je východiskom pre aplikovanie IÚI kvalitne spracovaná IÚS. Ak členský štát podporuje IÚR podľa nariadenia o spoločných ustanoveniach za IÚS zodpovedajú príslušné územné orgány alebo subjekty. Podpora môže byť realizovaná dvoma spôsobmi. Prvým je, že projekty sú už súčasťou IÚS. Druhým spôsobom je situácia, keď konkrétny zoznam projektov nie je vopred zahrnutý v IÚS; vtedy výber projektov zabezpečujú alebo sa na ňom podieľajú príslušné územné orgány alebo subjekty. V oboch prípadoch však platí, že všetky vybrané operácie musia byť v súlade s IÚS. Jednotný metodický rámec ukotvil terminológiu celého procesu IÚR, pravidlá pre fungovanie jednotlivých Rád partnerstva, resp. Kooperačných rád UMR a pravidlá pre vytváranie IÚS. Aj keď mal len odporúčací charakter, bol využívaný, a to najmä kvôli nedostatočnej skúsenosti aktérov s IÚS a IÚI. Niektoré jeho ustanovenia a najmä mechanizmus implementácie a parametre integrácie boli predmetom intenzívnych konzultácií s MIRRI SR. Podľa Jednotného metodického rámca

IÚS musí, okrem iných prvkov, obsahovať opis integrovaného prístupu na riešenie identifikovaných potrieb rozvoja a potenciálu danej oblasti.

V preverených IÚS bol integrovaný prístup popísaný len formalisticky, čo môže ohroziť preukázanie integrovanosti riešenia v období reálnej implementácie pri už zrealizovaných projektoch. IÚS pre UMR Košice bola schválená v novembri 2023. IÚS Košického kraja bola schválená v apríli 2023, bez povinného projektového zásobníka a napriek výhradám zástupcov štátnej správy. Po vydaní záväzných metodických usmernení RO už pôvodná verzia IÚS Košického kraja nebola v súlade s niektorými aktuálnymi požiadavkami. NKÚ SR zistil, že KSK nezabezpečil monitorovanie IÚS Košického kraja za rok 2023 v zmysle stanoveného spôsobu monitorovania a zákona o podpore regionálneho rozvoja. Zároveň odporučil KSK aktualizovať IÚS Košického kraja v zmysle platných usmernení RO, týkajúcich sa implementácie IÚR.

### Technokratické rozdelenie alokácie

Väčšia časť z celkovej pridelennej alokácie na realizáciu IÚI, vo výške 2,41 mld. eur, bola vyčlenená na úrovni krajov 1, 417 mld. eur, z toho pre Radu partnerstva Košického kraja vo výške 216,23 mil. eur. Pre oblasť UMR bola vyčlenená suma 0,994 mld. eur, z toho pre Kooperačnú radu UMR Košice vo výške 133,80 mil. eur.

Návrh prvého technokratického rozdelenia alokácií medzi jednotlivé opatrenia v rámci špecifických cieľov programu bol zo strany riadiaceho orgánu predstavený v novembri 2022 bez otvorenej diskusie so zástupcami územia a bez dôsledného zohľadnenia konkrétnych potrieb jednotlivých regiónov. Obe rady tak nemali možnosť smerovať podporu tam, kde bola najviac potrebná. Tento postup nebol v súlade s princípom partnerstva, keďže zástupcovia územia neboli zapojení do rozhodovania o rozdelení finančných prostriedkov. Zásadný posun nastal až v roku 2024, kedy MIRRI SR pristúpilo k sérii diskusií s územnými partnermi s cieľom nasmerovať alokáciu územia do tých opatrení, ktoré sú kľúčové a nosné pre napĺňanie potrieb územia. NKÚ SR hodnotí uvedený krok veľmi pozitívne. Najväčší dopyt po presunoch v Rade partnerstva Košického kraja bol v oblastiach energetickej efektívnosti budov, vzdelávanie a cykloinfraštruktúra. Celková výška presunov bola 4,37 mil. eur. V Kooperačnej rade UMR Košice dominovali energetické úspory, cyklodoprava a miestne komunikácie. Celková výška presunov bola 12,85 mil. eur.

### Nedostatočné plnenie úloh, plánovanie a koordinovanie vyhlasovaných výziev IÚI

MIRRI SR ako RO nesie konečnú zodpovednosť za prípravu, riadenie, monitorovanie a hodnotenie Programu Slovensko. Vzhľadom na uvedené kompetencie, NKÚ SR po ich preverení konštatuje, že nedošlo k dostatočnému plneniu úloh, a to najmä príprava legislatívnych a procesných podmienok a časovo-vecná koordinácia SO a územných partnerov. Neboli tak zabezpečené adekvátne podmienky pre implementáciu IÚI včas a jednoznačne. Výsledkom bol oneskorený začiatok implementácie Programu Slovensko vrátane IÚI, pričom v súlade s legislatívou získalo MIRRI SR kompetencie RO už v júli 2022.

Pre realizáciu IÚI je nevyhnutné, aby boli vyhlásené výzvy na predkladanie ŽoNFP, prostredníctvom ktorých sa môžu projekty realizovať. Prvá výzva na predkladanie ŽoNFP bola vyhlásená v decembri 2023 na Európske hlavné mesto kultúry 2026, avšak v rámci tejto výzvy bolo oprávneným územím iba územie Trenčianskeho samosprávneho kraja. Pre celé územie Slovenska bola prvá výzva pre ŽoNFP vyhlásená až vo februári 2024 z dôvodu oneskoreného regulačného rámca a oneskoreného legislatívneho ustanovenia IÚS v podmienkach SR. Táto výzva sa zameriavala na budovanie a posilňovanie prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v mestách a obciach.

MIRRI SR čiastočne splnilo úlohu stanovenú Uznesením vlády SR č. 639/2024 tým, že do konca roka 2024 bolo vyhlásených 26 z celkovo 27 plánovaných výziev v rámci IÚI.

RO v súlade s nariadením o spoločných ustanoveniach a s riadiacou dokumentáciou pripravil, aktualizoval a zverejňoval aktuálne harmonogramy plánovaných výziev, vrátane orientačných údajov. RO identifikoval v harmonograme plánovaných výziev tie, ktoré bolo vhodné pripraviť participatívnym spôsobom. Kontrolovaný subjekt vyhlásil výzvy, ktoré boli uvedené v jednotlivých verziách harmonogramov plánovaných výziev.

Napriek plneniu si povinností v oblasti vyhlasovania výziev, NKÚ SR poukazuje na nedostatočné plánovanie a nedostatočnú koordináciu zo strany RO:

- Výsledkom bolo meškanie vyhlasovania výziev a ich presúvanie do ďalších štvrťrokov, čo zaťažovalo odborné a časové kapacity žiadateľov a poskytovateľov.
- Výzvy neboli vyhlasované v časovej ani obsahovej následnosti. Žiadatelia boli nútení odkladať schvaľovanie projektových zámerov IÚI, kým neboli vyhlásené všetky tematicky relevantné výzvy.
- Vo väčšine prípadov boli vyhlasované výzvy pre jednotlivé opatrenia, v dôsledku čoho museli žiadatelia rozdeľovať svoje projektové zámery IÚI. Nemohli ich predkladať ako komplexné projektové zámery IÚI. Uvedené skutočnosti spomaľovali proces implementácie.
- Niektoré dopytovo-orientované výzvy na opatrenia v rámci IÚI boli vyhlásené skôr ako samotné výzvy IÚI. Tým sa obchádzalo územné rozhodovanie, ktoré bolo zabezpečené prostredníctvom oboch rád. Projekty, ktoré by mohli byť realizované v rámci strategických zámerov územia, boli presmerované do sektorových výziev bez kontextu širšej územnej vízie, čím bola narušená synergickosť a komplementarita investícií.

Problémom pri zavádzaní IÚI bola aj nejednoznačnosť, či sa má najskôr schváliť projektový zámer IÚI alebo vyhlásiť výzva. Táto nejasnosť spomaľovala a komplikovala prípravu projektových zámerov IÚI. Tento problém sa vyriešil až novelou zákona o príspevkoch z fondov EÚ a to v roku 2024.

### Nedostatočná integrovanosť projektov

Pre implementáciu IÚI je možné dosiahnuť integráciu tematickú (prepojenie viacero špecifických cieľov kohéznej politiky); územnú čiastočne (IÚI je možné realizovať v území bez ohľadu na hranice obcí, ale hranice krajov zostali prítomné ako bariéry pre IÚI, vzhľadom na rozdelenie alokácií podľa jednotlivých krajov); organizačnú (Rady partnerstva a Kooperačné rady UMR budú určovať nositeľov aktivít, ktorí môžu byť rôzni) a finančnú (IÚI môže integrovať aktivity podporené prostredníctvom zdrojov programu Slovensko). V praxi však zlyhalo dosiahnutie finančnej integrácie, keďže IÚI boli aplikované výhradne cez jeden fond, a to EFRR (s výnimkou alokácie z Kohézneho fondu pre Bratislavský kraj ako viac rozvinutý región).

Ku koncu roku 2024 Rada partnerstva Košického kraja schválila 103 projektových zámerov IÚI (37,82 % z alokácie) a Kooperačná rada UMR Košice 43 projektových zámerov IÚI (40,46 % z alokácie). K uvedenému dátumu bolo na úrovni KSK predložených 39 ŽoNFP, z ktorých bolo osem zazmluvnených. Za UMR Košice bolo predložených 21 ŽoNFP, z ktorých boli tri zazmluvnené. Spolu teda bolo ku koncu roka 2024 zazmluvnených iba 11 projektov.

Preverením projektových zámerov IÚI, ku ktorým boli podpísané Zmluvy o poskytnutí NFP NKÚ SR konštatuje, že rady sa, aj vzhľadom na problémy v oblasti vyhlasovania výziev, sústredili namiesto komplexných zámerov s rozvojovým potenciálom, najmä na jednoúčelové a izolované projekty realizované na území žiadateľa a bez strategického presahu. Zazmluvnené projektové zámery IÚI prispievali k naplneniu jednej priority programu. Išlo skôr o individuálne projekty, ktoré by mohli byť predmetom aj výziev s dopytovo orientovaným charakterom. Nemali strategický charakter. Týkali sa bežných kompetencií samospráv: modernizácie miestnych komunikácií, revitalizácie vnútroblokov, oddychových zón, zelenej infraštruktúry či rekonštrukcie vstupného priestoru pred obecným úradom. Prítomnosť integrovanej logiky sa formálne deklarovala iba vo väzbe na všeobecne definované ciele IÚS. Pri schvaľovaní projektov prevládala snaha o skoré čerpanie prostriedkov nad hodnotením ich prínosu pre rozvoj územia. Takýto prístup neprispieval k posilňovaniu konkurencieschopnosti regiónov. Projektami IÚI si mestá a obce sanovali investičný dlh. Využívali IÚI, pretože mali dlhodobu zanedbanú infraštruktúru a pre väčšinu z nich sú eurofondy jedinou možnosťou financovania opráv. V niektorých zazmluvnených projektoch neboli detailne vymedzené synergie a komplementarity. Chýbalo jasné určenie, s ktorými konkrétnymi projektmi budú súvisieť a opis ako budú nadväzovať na výstupy, výsledky súvisiacich projektov.

NKÚ SR odporučil KSK vyžadovať od žiadateľov detailnejší popis synergie a komplementarity projektových zámerov IÚI prostredníctvom uvedenia ako výstupy, výsledky predkladaných projektových zámerov IÚI nadväzujú na ciele IÚS a na výstupy, výsledky súvisiacich projektov.

NKÚ SR konštatuje, že z jedenástich zazmluvnených projektov predstavuje pozitívny príklad organizačnej integrácie projekt IÚI „Inovačné centrum Košického kraja“, so zapojením piatich organizácií (KSK, Mesto Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach), ktorého cieľom je riešiť odliv mozgov a nevyužitý inovačný potenciál regiónu podporou vzniku 40 startupov ročne.

### Absencia kritérií výberu projektových zámerov

Metodické usmernenie RO dáva radám iba možnosť uznesením schváliť kritériá pre výber projektových zámerov IÚI. Podľa NKÚ SR sú však kritériá hodnotenia a výberu projektových zámerov IÚI kľúčovým nástrojom, ktorý pomáha zefektívniť strategický rámec a premeniť ho na súbor projektov vedúcich k dosiahnutiu želaných rozvojových cieľov – len správne projekty môžu priniesť želané výsledky. Kritériá výberu projektových zámerov IÚI mali tak uľahčiť identifikáciu a výber tých projektových zámerov IÚI, ktoré majú najvýznamnejší regionálny dosah a sú v súlade s cieľmi regionálneho rozvoja.

NKÚ SR konštatuje, že rady nemali stanovené kritériá pre výber projektov. Interne si nastavili kritérium pre výber projektových zámerov IÚI a to pripravenosť projektov. Neskúmal sa ich prínos pre územie. Takto nastavené kritérium malo za cieľ zabezpečiť včasné schvaľovanie projektov a tým umožniť skoré čerpanie finančných prostriedkov. Zároveň vytváralo tlak na žiadateľov, aby urýchlene vypracovali a predložili svoje projektové formuláre. Bez kritérií pre výber projektových zámerov IÚI to bol netransparentný proces, ktorý nezabezpečoval, aby o výbere projektov rozhodovali ich prínosy pre územie.

NKÚ SR odporúča na základe dobrej praxe stanovenie a schválenie kritérií pre výber projektových zámerov IÚI.

### Činnosť subjektov systému implementácie v zmysle metodických usmernení

NKÚ SR preveril proces výberu, hodnotenia, schvaľovania projektových zámerov IÚI a vydávania rozhodnutia o poskytnutí príspevkov z fondov EÚ pre projekty IÚI na vzorke predložených ŽoNFP ku koncu roka 2024. Preverení boli zistené nedostatky týkajúce sa štyroch uznesení Rady partnerstva Košického kraja, ktorým chýbala povinná informácia o schválení projektu do výšky 100 % oprávnených výdavkov v zmysle metodického usmernenia RO. NKÚ SR zároveň identifikoval slabé miesto pri preukazovaní územnej dohody v rámci strategicko-plánovacích regiónov pri výbere projektových zámerov IÚI navrhovaných na schválenie Rade partnerstva KSK.

NKÚ SR odporúča na základe získaných informácií z webových sídiel iných samosprávnych krajov, aby kooperačné rady jednotlivých strategicko-plánovacích regiónov prijali uznesenie o zozname projektových zámerov IÚI, navrhovaných na schválenie, a postúpili ho Rade partnerstva Košického kraja. Na účely zvýšenia transparentnosti procesu výberu projektových zámerov IÚI NKÚ SR zároveň odporúča, aby boli tieto uznesenia zverejnené na webovom sídle KSK.

### Nízke kontrahovanie a čerpanie prostriedkov z EÚ fondov

Celkové kontrahovanie predstavuje dôležitý indikátor pripravenosti systému na implementáciu projektov financovaných z fondov EÚ. Je nevyhnutné pre zabezpečenie včasného a riadneho čerpania finančných prostriedkov, ktoré sú základom úspešného rozvoja regiónov a napĺňania strategických cieľov. K 30. 6. 2025 bolo na úrovni SR zazmluvnených 13 % alokácie Programu Slovensko, no reálne čerpanie dosiahlo iba 3 %, čo poukazuje na pomalé spustenie fyzickej realizácie projektov.

NKÚ SR upozorňuje, že pri implementácii prostriedkov z fondov EÚ je mimoriadne dôležité zohľadniť dodržiavanie pravidiel N+3. Prvé plnenie N+3 programu je k 31. 12. 2025, kedy musí Slovensko vyčerpať minimálne 1,54 miliardy eur (podľa stavu k 31.08. 2025 pre splnenie N+3 v roku 2025 je potrebné ešte vyčerpať 250,67 mil. eur). V prípade jeho neplnenia, nevyčerpané financie prepadnú (tzv. decommitment) a musia sa vrátiť do rozpočtu EÚ. Zníži sa tak


objem investícií v regiónoch, obmedzí sa rozvoj a modernizácia vo všetkých oblastiach (sociálna, zdravotná, vzdelávanie, veda a výskum, doprava, životné prostredie). Zvýši sa tlak na štátny rozpočet, keďže približne 70 až 80 % verejných investícií v SR je financovaných z fondov EÚ. Môže tak dôjsť k prehlbovaniu regionálnych rozdielov a celkovému zníženiu kvality života obyvateľov SR.

V súvislosti s nevyhnutnosťou akcelerovať čerpanie finančných prostriedkov s cieľom naplnenia pravidla N+3 a tým eliminovania vzniku možného dekomitmentu MIRRI SR predložilo radám partnerstva a kooperačným radám UMR minimálnu výšku čerpania v rokoch 2025 a 2026. Pre Radu partnerstva Košického kraja bola stanovená minimálna výška čerpania (zdroj EÚ) do konca roka 2025 v hodnote 27,23 mil. eur (12,59 % z alokácie) a 35,89 mil. eur (16,59 % z alokácie) do konca roka 2026. Pre Kooperačnú radu UMR Košice bola stanovená výška čerpania 16,85 mil. eur (12,59 % z alokácie) v roku 2025 a 22,21 mil. eur (16,59 % z alokácie) v roku 2026. Vzhľadom na to, že čerpanie na základe zúčtovaných žiadostí o platbu u oboch rád bolo k 31. 3. 2025 v objeme 0 %, existuje riziko nenaplnenia tohto plánu. MIRRI SR si zároveň vyžiadalo tzv. implementačné plány, v ktorých by mali rady vo štvrtročných intervaloch naplánovať a vyhodnotiť plány, resp. odhady stavu čerpania finančných prostriedkov z Programu Slovensko. Implementačné plány za I. štvrťrok 2025 boli zo strany oboch rád predložené MIRRI SR.

RO v spolupráci so SO vypracoval Strednodobé preskúmanie Programu Slovensko. Výsledkom je návrh presunu územných alokácií vo výške takmer 195 mil. eur a uvoľnenie sumy flexibility vo výške 1,98 mld. eur (16 % z celkového príspevku EÚ). Súčasne dochádza k akcelerácii využitia finančných prostriedkov vo vyhlásených výzvach. V dôsledku týchto okolností sa očakáva nárast objemu projektových zámerov IÚI aj ŽoNFP, predkladaných územnými partnermi. Zvýšený objem projektov IÚI a ŽoNFP môže viesť k preťaženiu implementačného systému, čo by mohlo spomaliť procesy, čerpanie fondov a zaťažiť administratívne kapacity.

Ku koncu prvého polroka 2025 bola viac ako polovica alokácie už schválená oboma radami. K uvedenému termínu boli Radou partnerstva Košického kraja schválené projektové zámery IÚI vo výške 54 % z poskytnutej alokácie. Podľa jej uznesenia majú žiadatelia sedem mesiacov od schválenia projektového zámeru IÚI na podanie ŽoNFP. Z projektových zámerov IÚI schválených do konca roka 2024 (37,82 % z alokácie) sa do konca júna 2025 pretransformovalo na podané žiadosti približne 92 %. Tento pomer možno hodnotiť ako priaznivý, keďže väčšina prijímateľov stihla v rámci stanovenej lehoty pripraviť a predložiť ŽoNFP. Za najkritickejší problém sa považuje fakt, že ku koncu júna 2025 nebolo zaznamenané žiadne finančné čerpanie.


Graf 1: stav implementácie IÚI za Radu partnerstva KSK k 30. 6. 2025

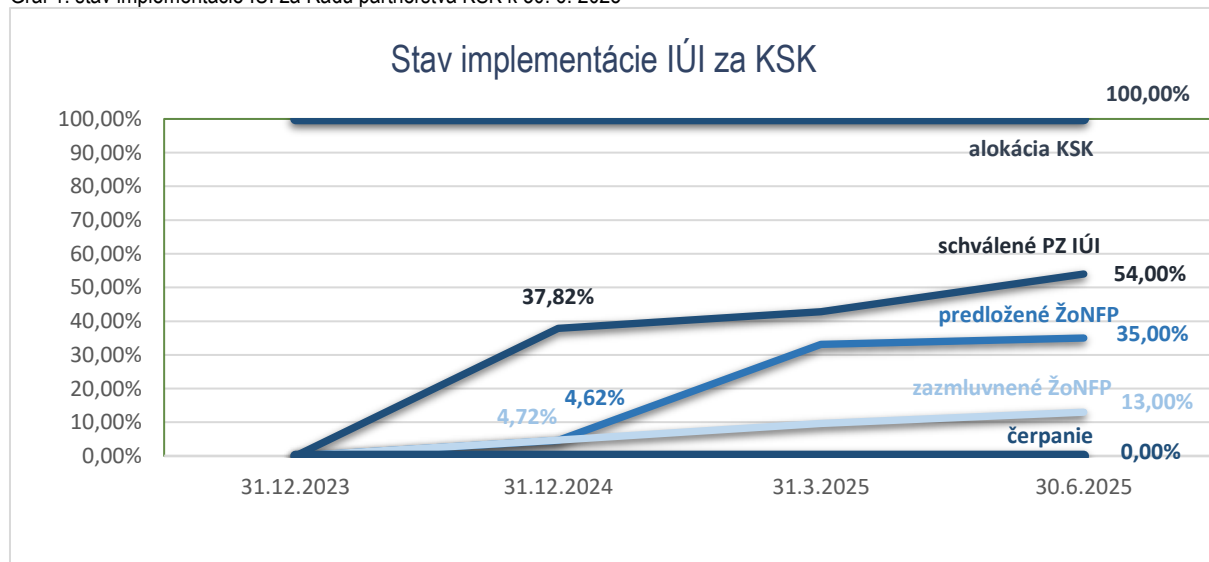

Zdroj: KSK, MIRRI SR; vlastné spracovanie

K 30. 6. 2025 dosahovala implementácia IÚI v území UMR Košice pomerne vysokú mieru rozpracovanosti, no s pretrvávajúcim rizikom v oblasti zazmluvňovania a čerpania finančných prostriedkov. Kooperačnou radou UMR Košice boli schválené projektové zámery IÚI vo výške 87 % z alokácie. Vzhľadom na to, že uznesenie Kooperačnej rady je účinné 6 mesiacov, možno pokladať za primerané, že miera predložených ŽoNFP dosiahla ku koncu júna 45,08 %.

Graf 2: stav implementácie IÚI za Kooperačnú radu UMR Košice k 30. 6. 2025

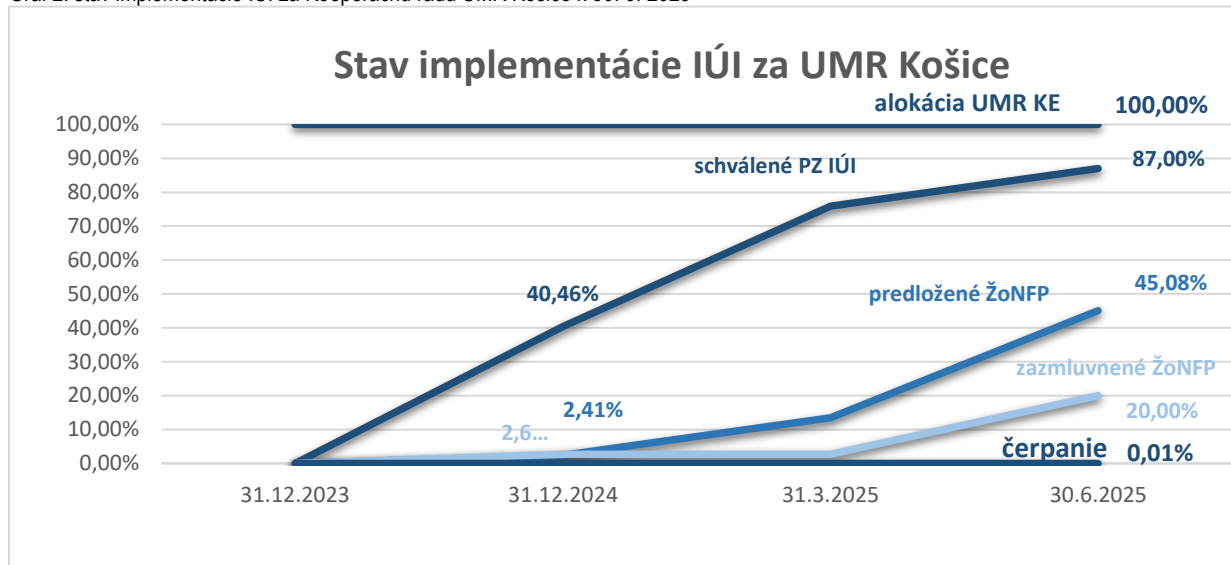

Zdroj: mesto Košice, MIRRI SR; vlastné spracovanie

Analýza implementačného procesu projektov v programovom období 2021 – 2027 poukázala na viacero pozitívnych, ale aj rizikových aspektov systému. Proces schvaľovania ŽoNFP prebiehal v analyzovaných prípadoch efektívne s priemernou dĺžkou 52 pracovných dní, čo je hlboko pod stanoveným limitom 70 pracovných dní od termínu predloženia ŽoNFP. Priemerná dĺžka celého procesu od registrácie projektového zámeru po jeho zazmluvnenie dosahovala 263 kalendárnych dní (181 pracovných dní), čo predstavuje takmer 9 mesiacov. Tento časový rámec je z hľadiska efektívneho čerpania prostriedkov relatívne dlhý a predstavuje potenciálne riziká pre prijímateľov. Patrí sem najmä riziko navýšenia projektových nákladov v dôsledku inflačných vplyvov, napr. rast cien materiálov, energií, mzdových nákladov ako aj možných zmien legislatívy.

## Porovnanie implementácie IÚI v Slovenskej republike a Českej republike v programovom období 2021 - 2027

Porovnanie implementácie IÚI v programovom období 2021–2027 ukazuje výrazné rozdiely medzi Slovenskou republikou a Českou republikou. Česká republika dosiahla rýchlejší a efektívnejší postup vo všetkých hlavných míľnikoch – pri schválení Partnerskej dohody, operačného programu, metodologickej dokumentácie aj vyhlásení výziev IÚI. Najvýraznejšie oneskorenie Slovenska je v účinnosti metodologickej dokumentácie (o 913 dní) a v prvých výzvach na IÚI (o 444 dní). Rozdiel 444 dní vo vyhlásení prvých výziev na IÚI znamená, že české územné subjekty mohli začať reálnu realizáciu svojich integrovaných projektov viac než rok pred slovenskými územnými subjektami.

Tabuľka 1: Porovnanie míľnikov implementácie IÚI v SR a ČR v programovom období 2021 – 2027

| Míľnik/krajina                    | Česká republika | Slovenská republika | Rozdiel (SR - ČR) |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| Schválenie Partnerskej dohody     | 13. 5. 2022     | 18. 7. 2022         | +64 dní           |
| Schválenie 1. operačného programu | 7. 8. 2022      | 22. 11. 2022        | +107 dní          |
| Účinnosť záväznej MD              | 1. 12. 2021     | 1. 6. 2024          | +913 dní          |
| Vyhlásenie 1. výzvy na IÚI        | 19. 9. 2022     | 6. 12. 2023         | +444 dní          |

Zdroj: NKÚ SR, NKÚ ČR; vlastné spracovanie. Poznámky: údaje v stĺpci "Rozdiel" predstavujú počet dní, o ktoré bola SR pozadu za ČR v každom míľniku, MD – metodická dokumentácia, ČR – Česká republika, SR – Slovenská republika

Slovenská republika sa rozhodla alokovať takmer pätinu všetkých prostriedkov politiky súdržnosti cez IÚI, čo z pohľadu strategického plánovania predstavuje ambiciózne nastavenie. Slovenská republika síce deklaruje vyšší podiel alokácie na IÚI, avšak v skutočnej realizácii je značný odstup. K 31. 12. 2024 Slovenská republika nečerpala žiadne finančné prostriedky z IÚI. V Českej republike ku koncu roka 2024 bolo už takmer 97 % prostriedkov IÚI vo výzvach, pričom zazmluvnenosť dosiahla vyše 21 % a čerpanie 5,2 %, čo odráža lepšiu pripravenosť a rýchlejšiu aktiváciu systému.

Tabuľka 2 Porovnanie implementácie IÚI v PO 2021 – 2027 z alokácie, kontrahovania a čerpania

| stav implementácie k 31.12.2024                                  | ČR             | SR             |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Alokácia finančných prostriedkov na politiku súdržnosti v eurách | 21 084 123 767 | 12 593 734 933 |
| Alokácia finančných prostriedkov na IÚI v eurách                 | 2 146 302 075  | 2 411 096 484  |
| % z alokácie prostriedkov EÚ na IÚI                              | 10,18          | 19,15          |
| Počet výziev                                                     | 30             | 26             |
| % z alokácie na IÚI vo vyhlásených výzvach                       | 96,61          | 76,36          |
| % z alokácie na IÚI v predložených ŽoNFP                         | 75,11          | 18,39          |
| % z alokácie na IÚI v zazmluvnených projektoch                   | 21,68          | 5,34           |
| % z alokácie na IÚI - čerpanie                                   | 5,2            | 0              |

Zdroj: NKÚ SR, NKÚ ČR; vlastné spracovanie

V Českej republike IÚS pozostáva z dvoch častí – koncepcnej a akčného plánu. Koncepcná časť IÚS obsahuje opatrenia, ktoré sú vzájomne prepojené. Prepojenia graficky ukazujú ako jednotlivé projekty spolupracujú. Cieľom je, aby nevznikali izolované projekty, ale riešenia so širším dopadom. Akčný plán obsahuje programový rámec a zoznam strategických projektov. Koncepcnú časť hodnotí a schvaľuje Ministerstvo pre miestny rozvoj ČR, ako gestor regionálnej politiky Českej republiky a tiež zastupiteľstvo nositeľa IÚS a riadiaci výbor. Programové rámce schvaľuje riadiaci orgán.

Na Slovensku MIRRI SR, ako gestor regionálneho rozvoja SR a riadiaci orgán Programu Slovensko IÚS nehodnotí a neschvaľuje. Za súlad projektov s IÚS zodpovedajú rady partnerstva alebo kooperačné rady UMR.

Slovenská republika má jeden program s viacerými prioritami. Česká republika má deväť operačných programov, v piatich sú zapojené IÚI. V oboch krajinách sú do realizácie IÚS zapojené dva fondy – EFRR a Kohézny fond. V Česku sa IÚI realizuje v troch metropolitných oblastiach a desiatich aglomeráciách. Na Slovensku je to 26 území; osem samosprávnych krajov a 16 UMR.

## Záver

V území KSK a UMR Košice sa očakávané zjednodušenie a zrýchlenie čerpania eurofondov nenaplnilo. V polovici programového obdobia zostáva miera čerpania nízka. Na jeho začiatku bola implementácia IÚR v Košickom kraji a na území UMR Košice výrazne ovplyvnená zdĺhavou harmonizáciou a stabilizáciou štatútov Rady partnerstva KSK a Kooperačnej rady UMR Košice. Tento proces zahŕňal obdobia ich nečinnosti a opakované úpravy ich štatútov. Neskoré schvaľovanie projektových zámerov IÚI oboma radami bolo spôsobené čakaním na vyhlásenie výziev s cieľom predísť ich opätovnému schvaľovaniu. Obmedzená účasť zástupcov oboch rád na zasadnutiach navzájom viedla k nedostatočnej výmene informácií o projektoch a investičných prioritách. Tým sa oslabil koordinácia a znížil synergický efekt opatrení pri realizácii IÚR v Košickom kraji. Nedostatočná koordinácia RO a SO pri vyhlasovaní výziev posúvala schvaľovanie projektových zámerov IÚI a oslabovala ich strategické prepojenie. Hlavný prínos IÚI, ktorý spočíva v koordinovanom a synergickom rozvoji územia sa v podmienkach KSK a UMR Košice zatiaľ naplňa iba čiastočne. Schválené projekty mali charakter individuálnych projektov orientovaných skôr na sanáciu investičného dlhu než na transformačné investície s nadlokálnym efektom. Zameranosť rád na pripravenosť projektových zámerov IÚI bez jasných kritérií hodnotenia prínosu pre územie viedla k výberu, ktorý síce podporil ich rýchle schvaľovanie s cieľom skorého čerpania finančných prostriedkov, no zanedbal skutočný strategický dopad investícií na rozvoj regiónu. Obciam a mestám predkladajúcim projektové zámery IÚI chýbala jasná predstava o tom, ako má vyzerat integrovaný projekt a ako preukázať jeho synergickú hodnotu.

Z pohľadu NKÚ SR jedným z dôvodov schvaľovania individuálnych a izolovaných projektov bolo aj nesprávne pochopenie filozofie tohto nástroja. Viaceré samosprávy si nesprávne vykladali princíp rovnosti prístupu ako potrebu rovnomerne rozdeliť financie medzi všetky obce a mestá, bez ohľadu na strategický význam investícií. Tento prístup odporuje podstate IÚI, ktorá má podporovať nadlokálne projekty s vyšším synergickým efektom. Výsledkom tak bolo uprednostňovanie menších, málo koordinovaných projektov s obmedzeným územným dopadom namiesto strategických riešení so širším prínosom pre celý región.

NKÚ SR upozorňuje, že súčasná štruktúra a výška eurofondov, ktoré má Slovensko k dispozícii v aktuálnom programovom období, je výnimočná a po roku 2027 sa už pravdepodobne nebude opakovať. O to väčší dôraz by mal byť kladený na efektívne využitie týchto prostriedkov teraz. Zároveň platí, že ak sa bude budúca politika súdržnosti EÚ ešte viac zameriavať na podporu konkurencieschopnosti členských štátov a ich regiónov, bude nevyhnutné vo väčšej miere stavať na nástrojoch IÚR, ktoré umožňujú lepšie cielenie investícií podľa potrieb konkrétnych území.

### Reakcie kontrolovaných subjektov

Z vykonaných kontrol boli vypracované 2 protokoly o výsledku kontroly a 1 záznam o výsledku kontroly v meste Košice. Námietať proti pravdivosti, úplnosti a preukázateľnosti kontrolného zistenia vznieslo MIRRI SR. Námietať smerovala k procesom týkajúcim sa schvaľovania, resp. prerokovania návrhu využívania služieb tretích osôb príslušnou komisiou Monitorovacieho výboru, no netýkala sa podstaty zistenia, ktorým bola povinnosť aktualizovať Delegačnú zmluvu s Úradom pre verejné obstarávanie. Podľa oznámenia o výsledku preverenia námiety nebola potvrdená jej opodstatnenosť. V záujme odstránenia zistenia uzavreli RO a Úrad pre verejné obstarávanie Dodatok č. 1 k Delegačnej zmluve, ktorý nadobudol účinnosť dňa 23.8.2025.

### Kontakt

#### Najvyšší kontrolný úrad SR

Priemyselná 2  
824 73 Bratislava 26  
☎ +421 250 114 911  
✉ [info@nku.gov.sk](mailto:info@nku.gov.sk)

#### MIRRI SR

Pribinova 25  
811 09 Bratislava  
☎ +421 2 2092 8888  
✉ [kontakt@mirri.gov.sk](mailto:kontakt@mirri.gov.sk)

#### Košický samosprávny kraj

Úrad Košického samosprávneho kraja  
Námestie Maratónu mieru 1  
042 66 Košice  
☎ +421 55 7268 111  
✉ [vuc@vucke.sk](mailto:vuc@vucke.sk)

#### mesto Košice


Magistrát mesta Košice  
Trieda SNP 48/A  
040 11 Košice  
☎ +421 556 419 111  
✉ [kontakt@kosice.sk](mailto:kontakt@kosice.sk)

## Zoznam použitých skratiek

| Skrátený názov                                           | Úplné znenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EÚ                                                       | Európska únia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EFRR                                                     | Európsky fond regionálneho rozvoja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IÚI                                                      | Integrovaná územná investícia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IÚR                                                      | Integrovaný územný rozvoj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IÚS                                                      | Integrovaná územná stratégia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ITMS21+                                                  | ITMS21+, nástroj pre žiadosti, implementáciu a monitorovanie fondov EÚ, slúži žiadateľom zapojeným do prípravy, administrácie, výberu, kontroly, analýzy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Jednotný metodický rámec                                 | Jednotný metodický rámec pre prípravu integrovaných územných stratégií a integrovaných územných investícií v Slovenskej republike v programovom období 2021-2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kooperačná rada UMR Košice                               | Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja Košice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| KSK                                                      | Košický samosprávny kraj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MIRRI SR                                                 | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Metodické usmernenie                                     | Metodické usmernenie Riadiaceho orgánu pre Program Slovensko č.8, Metodické usmernenie k podpore integrovaného územného rozvoja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| nariadenie o spoločných ustanoveniach                    | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku |
| nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o EFRR a KF | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2021/1058 z 24. júna 2021 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| NFP                                                      | Nenávratný finančný príspevok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NKÚ SR                                                   | Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| NKÚ ČR                                                   | Najvyšší kontrolný úrad Českej republiky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| NUTS 3                                                   | Nomenclature of Units for Territorial Statistics, Nomenklatúra územných štatistických jednotiek územné celky vytvorené pre štatistické účely Eurostatu; ekvivalent na Slovensku: Kraj                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| projektový zámer IÚI                                     | Projektový zámer Integrovannej územnej investície                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| RO                                                       | Riadiaci orgán Programu Slovensko 2021 - 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SO                                                       | Sprostredkovateľský orgán                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| UMR                                                      | udržateľný mestský rozvoj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VÚC                                                      | Vyšší územný celok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| zákon o podpore regionálneho rozvoja                     | Zákon č.539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| zákon o príspevkoch z fondov EÚ                          | Zákon č.121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ŽoNFP                                                    | Žiadosť o nenávratný finančný príspevok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Prílohy

Príloha č. 1

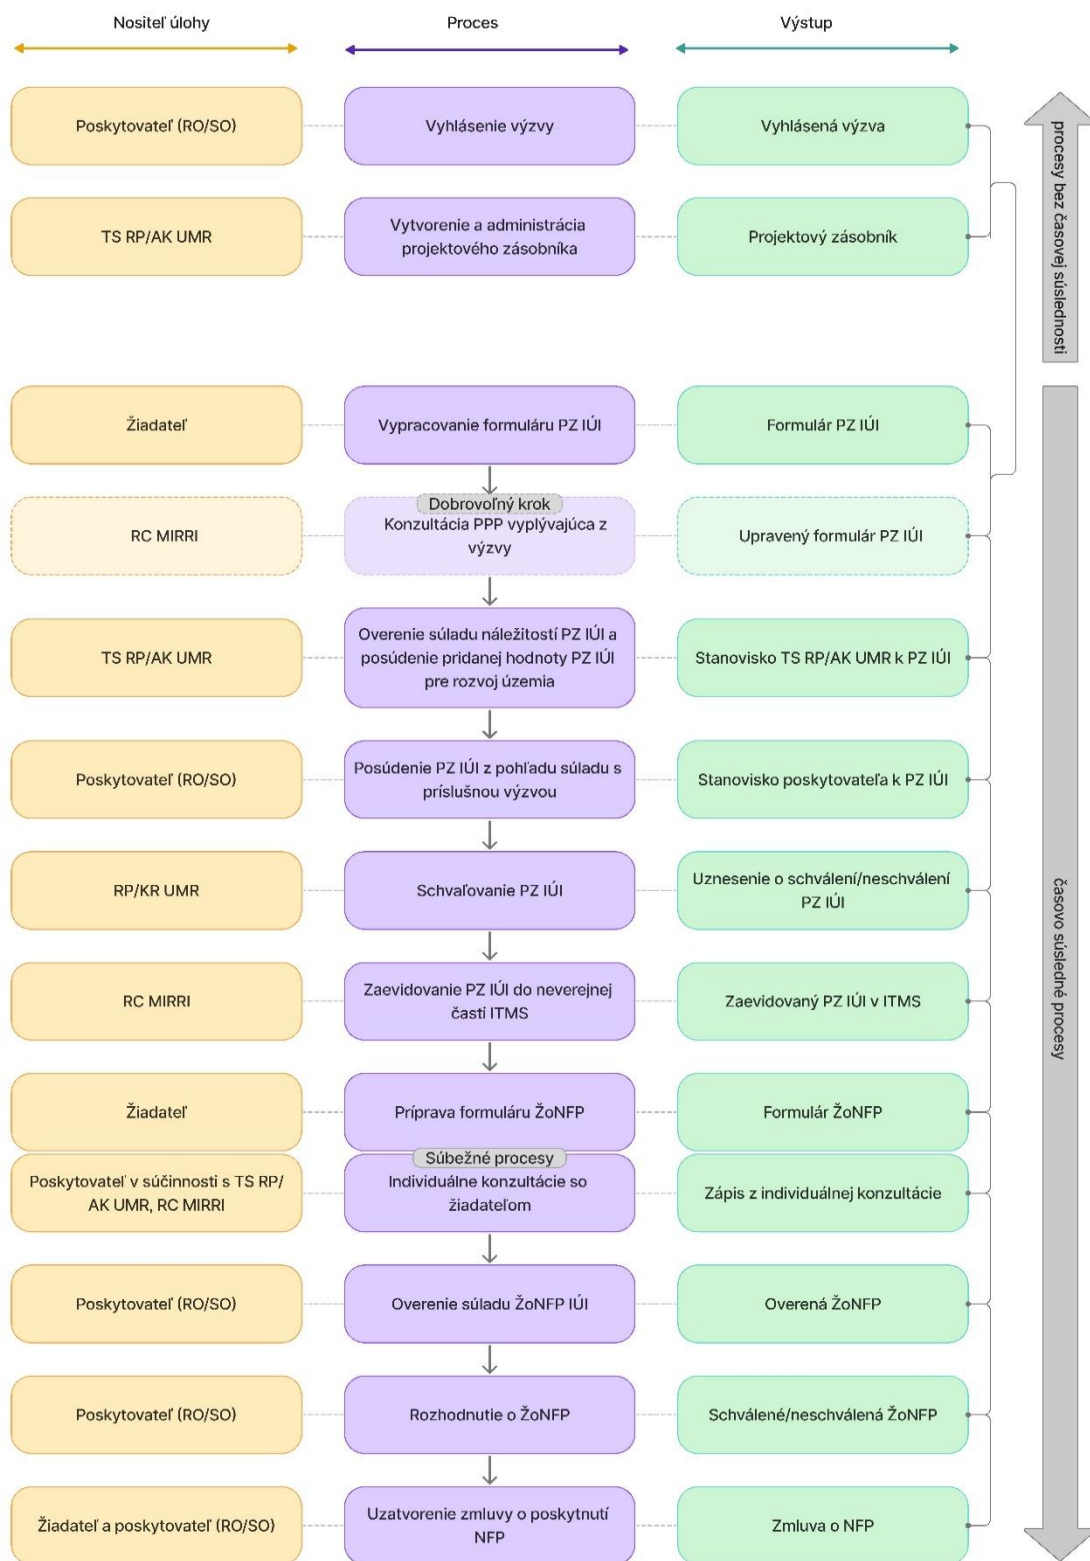

Zdroj: MIRRI SR
